ตัวอย่างการดำเนินการ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
จังหวัดกำแพงเพชร

แบบรายงานผลการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย

จังหวัดกำแพงเพชร

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ไทรงาม

๒. คำอธิบายการดำเนินการโดยสังเขป
(เช่น ประเภทของบ่อดักไขมัน เป็นบ่อดักไขมันที่ประชาชนทำขึ้นเองหรือเป็นบ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูป พร้อมระบุวิธีการจัดทำบ่อดักไขมันหรือราคาของบ่อดักไขมัน ระยะเวลาในการติดตั้งบ่อดักไขมัน สถานที่ติดตั้งบ่อดักไขมัน การใช้งานบ่อดักไขมัน งบประมาณที่ใช้ในการติดตั้งบ่อดักไขมัน เป็นต้น)
บ่อดักไขมันแบบจัดทำขึ้นเอง โดยใช้งบประมาณ ซื้อถัง ๙๕ บาท และใช้ท่อเหลือใช้ของ อบต. โดยมีการติดตั้ง ๒ จุด จุดที่ ๑ ติดตั้งที่ อบต.ไทรงาม และจุดที่ ๒ ติดตั้งที่ ศพด.ไทรงาม

๓. ภาพการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตัวอย่างการดำเนินการ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
จังหวัดจันทบุรี

แบบรายงานผลการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย

จังหวัด จันทบุรี

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

๒. คำอธิบายการดำเนินการโดยสังเขป

ประเภทบ่อดักไขมัน	แบบตั้งพื้น (บนดิน) เทศบาลเมืองขลุงจัดทำขึ้น	
วัสดุอุปกรณ์	๑. ถัง Q BOX	จำนวน ๑ ใบ
	๒. ท่อ PVC ขนาด ๑ นิ้ว	จำนวน ๓ ท่อน
	๓. ข้อต่อ PVC ขนาด ๑ นิ้ว	จำนวน ๒ ชุด
	๔. ข้องอ	จำนวน ๑ ชิ้น
	๕. ข้อต่อ ๓ ทาง ขนาด ๑ นิ้ว	จำนวน ๑ ชิ้น
	๖. ตะกร้ากรองเศษอาหาร	จำนวน ๑ ใบ
	๗. วัสดุกรอง (กรวด, ทราย, ถ่าน, อื่นๆ)	
	๘. ซิลิโคนยาแนว	
	๙. แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด	
สถานที่ติดตั้ง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองขลุง	
ระยะเวลาการติดตั้ง	๒ ชั่วโมง	
การใช้งานบ่อดักไขมัน	จัดหากล่อง Q BOX ตามร้านค้าทั่วไป จากนั้นนำแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดมาตัดให้พอดีกับขนาดความกว้างของกล่องเพื่อจะทำเป็นฉากกั้นระหว่างพื้นที่รับน้ำเสียส่วนกรองน้ำ จากนั้นใช้ซิลิโคนยึดฟิวเจอร์บอร์ดติดกับกล่องให้แน่นเจาะรูแล้วต่อระบบท่อและตะกร้ากรองเศษอาหารด้านบน ใส่วัสดุกรองลงในกล่องและปิดฝา และนำไปติดตั้งเข้ากับอ่างล้างจานสามารถใช้งานได้ทันที	

๓. ภาพการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบรายงานผลการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
จังหวัด จันทบุรี

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

๒. คำอธิบายการดำเนินการโดยสังเขป

ประเภทบ่อดักไขมัน	แบบตั้งพื้น (บนดิน) เทศบาลตำบลปัถวีจัดทำขึ้น	
วัสดุอุปกรณ์	๑. ถัง Q BOX	จำนวน ๑ ใบ
	๒. ท่อ PVC ขนาด ๑ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๘ cm.	จำนวน ๓ ท่อน
	๓. ข้อต่อ PVC ขนาด ๑ นิ้ว	จำนวน ๒ ชุด
	๔. ข้องอ ขนาด ๑ นิ้ว	จำนวน ๑ ชิ้น
	๕. ข้อต่อ ๓ ทาง ขนาด ๑ นิ้ว	จำนวน ๑ ชิ้น
	๖. ตะกร้ากรองเศษอาหาร	จำนวน ๑ ใบ
	๗. วัสดุกรอง (กรวด,ทราย,ถ่าน,อื่นๆ)	
	๘. ซิลิโคนยาแนว	
	๙. แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด	
สถานที่ติดตั้ง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัถวี , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมะทาย	
ระยะเวลาการติดตั้ง	๒ ชั่วโมง	
การใช้งานบ่อดักไขมัน	จัดหาตัวถังคือกล่อง Q BOX หรือกล่องอเนกประสงค์ที่หาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปหรือที่เลิกใช้แล้ว จากนั้นนำแผ่นนำแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดมาตัดให้พอดีกับขนาดความกว้างของกล่องเพื่อจะทำเป็นฉากกั้นระหว่างพื้นที่รับน้ำเสียและส่วนกรองน้ำ จากนั้นใช้ซิลิโคนยึดฟิวเจอร์บอร์ดติดกับกล่องให้แน่น เจาะรูแล้วต่อระบบท่อและตะกร้ากรองเศษอาหารด้านบน ใส่วัสดุกรองลงในกล่องและปิดฝา และนำไปติดตั้งเข้ากับอ่างล้างจานสามารถใช้งานได้ทันที <u>ข้อแนะนำ</u> ๑. ควรทำความสะอาดตะแกรงดักเศษอาหารเป็นประจำทุกวัน ๒. ระบายไขมันออกโดยใส่ถุงดำหรือภาชนะรองรับเป็นประจำทุกวัน โดยปลดท่ออ่อนที่ยึดอยู่บริเวณด้านข้างตัวถัง ๓. ควรมีการล้างทำความสะอาดถังทุก ๑ เดือน	
งบประมาณ	๓๗๖ บาทต่อชุด	

๓. ภาพการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบรายงานผลการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
จังหวัดจันทบุรี

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๒. คำอธิบายการดำเนินการโดยสังเขป

ประเภทบ่อดักไขมัน	แบบตั้งพื้น (บนดิน) ประชาชนจัดทำขึ้นทำขึ้น	
วัสดุอุปกรณ์	๑.ถังพลาสติกใส 5 ลิตร	จำนวน ๑ ใบ
	๒.ท่อ PVC ขนาด ๑ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๘cm.	จำนวน ๓ ท่อน
	๓. ข้อต่อ PVC ขนาด ๑ นิ้ว	จำนวน ๒ ชุด
	๔. ข้องอ ขนาด ๑ นิ้ว	จำนวน ๑ ชิ้น
	๕. ข้อต่อ 2 ทาง ขนาด ๑ นิ้ว	จำนวน 2 ชิ้น
	๖. ตะกร้ากรองเศษอาหาร	จำนวน ๑ ใบ
	๗. วัสดุกรอง (กรวด,ทราย,ถ่าน,อื่นๆ)	
	8. กาวพลาสติก	
สถานที่ติดตั้ง	นายวิเชษฐ์ บุญคง บ้านเลขที่ ๙๙/๗ ม.๕ ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี	
ระยะเวลาการติดตั้ง	๒ ชั่วโมง	
การใช้งานบ่อดักไขมัน	บ่อดักไขมันแบบนำถังน้ำมาประยุกต์ใช้เป็นบ่อดักไขมันอย่างง่าย และประหยัด ใช้กับบ้านเรือน โดยมีส่วนประกอบ คือ ถังน้ำ พลาสติกที่มีขายทั่วไปในท้องตลาด ขนาดประมาณ 50 ลิตร ใช้ท่อพีวีซีพร้อมข้อต่อสามทางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว เจาะรูถังน้ำพลาสติกแล้วต่อท่อพีวีซี ยาด้วยกาวพลาสติกแบบใช้ ความร้อนละลาย โดยให้ท่อเข้าอยู่สูงกว่าท่อออกประมาณ 5 เซนติเมตร นำตระกร้าพลาสติกที่เป็นตะแกรงมาประกอบเข้ากับ ไม้แขวนเสื้ออลูมิเนียมหรือลวดที่ทำเป็นหูหิ้ว แขวนไว้ที่ทางน้ำเข้า เพื่อดักขยะและเศษอาหาร ส่วนท่อน้ำออกนั้นให้ต่อท่อในถังให้ ลึกลงไปถึงก้นถังโดยปลายท่ออยู่ห่างจากก้นถังประมาณ 15 เซนติเมตร <u>ข้อแนะนำ</u> ๑. ควรทำความสะอาดตะแกรงดักเศษอาหารเป็นประจำทุกวัน ๒. ระบายไขมันออกโดยใส่ถุงดำหรือภาชนะรองรับเป็นประจำทุกวัน โดยปลดท่ออ่อนที่ยึดอยู่บริเวณด้านข้างตัวถัง ๓. ควรมีการล้างทำความสะอาดถังทุก ๑ เดือน	
งบประมาณ	๓๕๐ บาทต่อชุด	

๓. ภาพการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตัวอย่างการดำเนินการ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบรายงานผลการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย

๑. เทศบาลตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. คำอธิบายการดำเนินการโดยสังเขป

ประเภทบ่อดักไขมัน เป็นบ่อดักไขมันที่วัดป่าพระเจ้าทำขึ้นเอง เพื่อใช้ดักไขมันหลังการล้างทำความสะอาดภาชนะ เนื่องจากเป็นบริเวรศาลาการเปรียญ

ตัวอย่างการดำเนินการ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
จังหวัดอ่างทอง

แบบรายงานผลการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว

๒. คำอธิบายการดำเนินการโดยสังเขป

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ได้ดำเนินการประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศใช้ ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และแผ่นพับในหมู่ที่ ๑-๕ ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

๓. ภาพการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว

อุปกรณ์ในการจัดทำบ่อดักไขมันฯ ดังนี้

๑. ถังสี ๑ ใบ เป็นเงิน ๕๐ บาท
๒. ข้อต่อเกียวนอก ๑ นิ้ว ๑ ตัว เป็นเงิน ๑๒ บาท
๓. ข้อต่อเกลียวใน ๑ นิ้ว ๑ ตัว ๑๒ บาท
๔. ตะกร้า ๑ ใบ เป็นเงิน ๒๐ บาท
๕. สายยางใส (ของใช้ในบ้านนำมาใช้ใหม่)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๔ บาท (-เก้าสิบสี่บาทถ้วน-)

ระยะเวลาในการจัดทำ ๑ วัน สถานที่ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียอยู่ด้านหลังอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

<u>รูปภาพ</u>

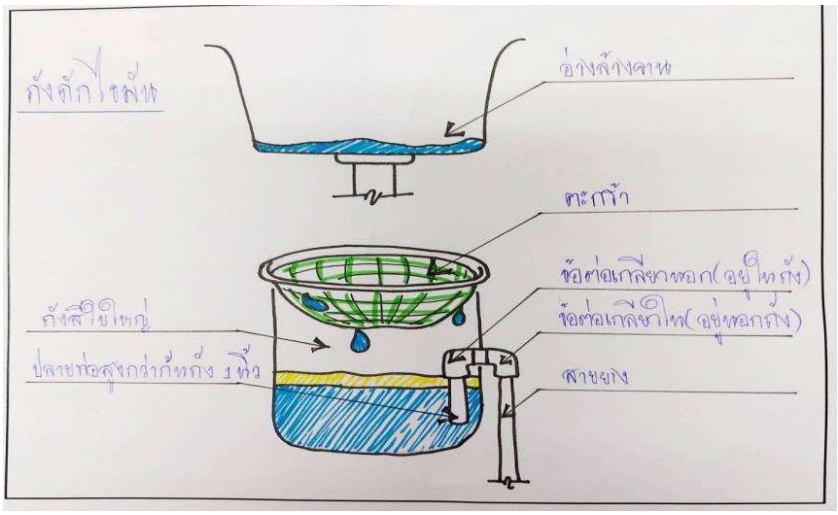

แบบรายงานผลการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ตัวอย่างการดำเนินการ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
จังหวัดอุดรธานี

แบบรายงานผลการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
จังหวัด อุดรธานี

๑.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

๒.คำอธิบายการดำเนินการโดยสังเขป

ประเภทบ่อดักไขมัน เป็นบ่อดักไขมันที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม แบบสร้างเอง

-วิธีการทำบ่อดักไขมัน : แบบสร้างเอง

-ระยะเวลาในการติดตั้งบ่อดักไขมัน : ๑ วัน

-สถานที่ติดตั้งบ่อดักไขมัน : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม

-การใช้งานบ่อดักไขมัน : สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐาน

-งบประมาณที่ใช้ในการติดตั้งบ่อดักไขมัน : ๕๐๐ บาท (งบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม)

๓.ภาพดำเนินการในการติดตั้งบ่อดักไขมันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑) เลือกขนาดที่วงบ่อที่ต้องการ เพื่อทำการขุดหลุมโดยมีความกว้างและความลึกมากกว่าขนาดวงบ่อถังดักไขมันเล็กน้อย

๒) ทำการเชื่อมต่อท่อน้ำทิ้งเข้ากับวงบ่อ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ภายใน (ตะแกร่งดักไขมัน, ช่องแยกไขมัน)

๓) ทำการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำทิ้งที่ผ่านการแยกไขมันออกเรียบร้อยแล้วเข้ากับท่อระบายน้ำทิ้งสาธารณะ
